

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1 от 18.03 2025г.

Приложение N 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137

Продавец: Индивидуальный предприниматель Мусалымов Р.К.
Адрес: 453631, г. Баймак, ул. Ветеринарная, 10
ИНН продавца: 025400162248
Грузополучатель и его адрес: 453631, г. Баймак, ул. Ветеринарная, 10
Грузополучатель и его адрес: Администрация сельского поселения Зигайрский сельсовет
К платежно-расчетному документу № от
Получатель: Администрация сельского поселения Зигайрский сельсовет
Адрес: Республика Башкортостан с. Ургаза
ИНН / КПП покупателя: 0254002080 / 025401001
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественны х прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налогов ая ставка	Сумма налога, предъявляем ая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождени я товара		Номер таможенной декларации
	Код обозначение (национальн ое)	Условное обозначение (объем)								Циф- рово и код	Краткое наиме- нование	
водоснабжение модульного здания СУБ в с. Ургаза МР Баймакский район согласно договора, КС-2, КС-3	2	2a шт	1	4	5	6 без акциза	7 без НДС	8 без НДС	9 190 880,00	10 -	10a -	11 -
Всего к оплате: 190880 (Сто девяносто тысяч восемьсот восемьдесят рублей)						X		0,00				

Руководитель, Организация

Руководитель организации
или иное уполномоченное
лицо

Индивидуальный

(подпись)
(подпись)

Мусалымов Р.К.
(ф. и. о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное
лицо

(подпись) Не предусмотрен (ф. и. о.)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание. 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показывать «Главный бухгалтер (подпись) (ф.и.о.)» не формируется.

050x 2x2x 11

Номер	Обоснование	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.					
			на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен		
по позиции	порядку по смете	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Новый раздел

Земельные работы

1	ГЭСН01-01-010-42	Разработка грунта в отвале экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м³, группа грунтов: 3	1000 м³	0,326	1	0,326						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				3,9845					1 109,96
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч				3,9845					1 109,96
	2 ЗМ											
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч				20,75125					17 236,40
	91.01.05-066	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м³	маш.-ч				63,85					8 167,28
	4-100-050	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч				20,75125					17 236,40
	Итого прямые затраты						20,75125					8 167,28
	ФОТ											26 613,64
	Пр/812-001.1-1, НР Земельные работы, выполняемые механизированным		%				92					9 277,24
	Приказ № 812/пр											7 681,55
	от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-001.1, СП Земельные работы, выполняемые механизированным		%				46					3 627,40
	Приказ № 774/пр											
	от 11.12.2020 п.16											

Сметно по позиции

116 577,28

17 020,75

2	ГЭСН01-01-010-42	Разработка грунта и траншей и котлованов групповой	100 м³	0,12	1	0,12						
	ФОТ в 3 м³ вручную в подрытом каноне при наличии											
	кредования, группа грунтов: 3		чел.-ч				44,52					13 539,87
	1 ОТ(ЗТ)											
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				371					13 539,87
	2 ЗМ											
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч				14,4					927,50
	91.05.14-025	Краны переставные, грузоподъемность 1 т	маш.-ч				120					4 379,47
	4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч				14,4					927,50
	Итого прямые затраты						14,4					4 379,47
	ФОТ											18 846,84
	Пр/812-001.2-1, НР Земельные работы, выполняемые ручным способом		%				89					17 919,34
	Приказ № 812/пр											14 353,39
	от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-001.2, СП Земельные работы, выполняемые ручным способом		%				40					6 092,58
	Приказ № 774/пр											
	от 11.12.2020 п.16											

Всего по позиции

327 440,08

39 292,81

3	ГЭСН01-01-033-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 69 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м³	0,337	1	0,337						
	2 ЗМ											
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч				3,17454					3 785,80
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч				3,17454					1 249,44
	4-100-050	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч				3,17454					3 785,80
	Итого прямые затраты						3,17454					1 249,44
	ФОТ											6 036,24
												1 249,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4 М	01.02.03-0001 Асфальт газобетонный технический 01.02.08-0001 Кислород газобетонный технический 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4-5 мм 23.02.02-0034 Трубы стальные электросварные прямые из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	М3 М3 кг М	0,018 0,074 0,1 0,4	0,018 0,074 0,1 0,4		340,41 114,64 0,77 0,4	1,71 0,77				157,58 10,48 6,53 17,10
	ФОТ	Итого прямые затраты										123,47
	Приб/12-018-0-1, НР Наружные сети водопровода, канализации, Приказ № 812/пр теплоснабжения, газопровода от 21.12.2020 п.25 Приб/74-018-0, СП Наружные сети водопровода, канализации, Приказ № 774/пр теплоснабжения, газопровода от 11.12.2020 п.16	% %	117 74	0,9 0,85	105,3 62,9							1 391,76 671,58 707,17
12	12	ГЭСН22-04-001-01 Устройство крупных колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих 1 ОТ(3Т)	10 М3	0,116	1	0,116				2 621,36		2 621,36
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2 2 ЗМ	Чел.-ч Чел.-ч	10,2776 88,6			10,2776 10,2776				311,80		3 204,56 3 204,56
	ОТМ(3Тм)	Чел.-ч	1,18944									1 065,31
	91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч Чел.-ч	2,82 2,82			0,32712 0,32712				1 607,46 460,03		450,59 525,83
	91.06.05-011 Потручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	0,23			0,02668				1 599,00		150,49 42,66
	4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	0,23			0,02668				393,58		10,50
	91.08.09-025 Трамбовки электрические	Маш.-ч	0,32			0,03712				16,28		0,60
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч Чел.-ч	7,13 7,13			0,82708 0,82708	477,92	1,25		597,40 342,46		494,10 283,24
	91.16.01-002 Электростанции передвижные, мощность 4 кВт 4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч Чел.-ч	0,16 0,16			0,01856 0,01856				114,35 342,46		2,12 6,36
	4 М	М3	0,0331			0,000353				31,46		6 355,64
	01.7.03.01-0001 Вода 01.7.15.05-011 Газоды строительные	Т Т	0,0008 0,0008			0,0000928				86 032,78		7,98
	02.2.05.04-2080 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	М3	2,26			0,26216	2 184,44	1,37		2 992,68		784,56
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I 04.1.02.05-0003 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) 04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50 11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-50 мм, сорт III	Т М3 М3 М3	0,0011 1,33 0,1 0,04			0,0001276 0,15428 0,0116 0,00464	5 275,05 5 067,51 4 178,41 15 341,31	1,34		7 068,57 780,27 48,47 71,18		0,90 780,27 48,47 71,18
	08.4.03.03-0032 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	Т	0,64			0,07424				62 800,02		4 682,27
П.Н	05.1.01.09 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм	М3	0									
П.Н	05.1.01.09 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм	М3	0									
Н	05.1.06.06 Плиты покрытий и перекрытий ребристые железобетонные	М3	3,95			0,4582						
П.Н	07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием трубных профилей и круглых труб	м	0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П.Н	08.1.02.06	Люди-чужие	шт	0							
	Н	11.1.03.06	Шты из досок	м2	1,2		0,1392					
	Итого прямые затраты											
	ФОТ											
	Пр/812-018-0-1, НР Наружные сети водопровода, канализации, Примаз № 812/пр теплоснабжения, газопровода от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-018-0, СП Наружные сети водопровода, канализации, Примаз № 774/пр теплоснабжения, газопровода от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции											
13	13	ФСБЦ-06.1.01.09-1008	Концы горюшин колодцев железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 60 до 100 кг/м3	м3	0,8	1	0,8	19 881,27	1,19	148 483,28		17 224,06
	Всего по позиции											
14	14	ФСБЦ-06.1.01.09-1022	Плиты перекрытий водоприемных колодцев железобетонные, объем до 0,07 м3, бетон В16, расход арматуры от 100 до 160 кг/м3	м3	0,36	1	0,36	19 562,10	1,46	29 144,67		19 022,17
	Всего по позиции											
15	15	ФСБЦ-08.1.02.06-0011	Люк, круглый легкий, номинальная нагрузка 16 кН, диаметр лаза 600 мм	шт	1	1	1	3 680,64	1,48	6 299,20		10 482,08
	Всего по позиции											
16	16	ГЭСНм08-02-147-10	Кабель, до 36 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,06	1	0,06					6 299,20
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8											
	2-3М											
	ОТМ(ЗТМ)											
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6											
	91.06.01-003 Демкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т											
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)											
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											
	4 М											
	01.7.06.07-0032 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепленные пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм											
	01.7.15.14-0165 Шпурлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм											
	10.3.02.03-0011 Притон оловянно-свинцовые беспрямые, марка ПОС30											
	14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123											
	Итого прямые затраты											
	16.1.421/пр_2020_п.75_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы											
	ФОТ											
	Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
	Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах											
	Всего по позиции											
17	17	ФСБЦ-2.1.1.06-03-1072	Кабель, силовой с медными жилами ВБШв 2х2,5кВ(Н)660	1000 м	0,006	1	0,006	87 031,69	1,03	13 222,20		661,11
	Всего по позиции											
	Итого											
	295,69											
	4,71											
	243,72											
	236,41											
	124,30											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	ГЭСН11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,6	1	0,6					448,21
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,15					4 719,91
		1-100-49 Средний разряд работы 4,9		чел.-ч	24,3		12,15					4 719,91
		2 ЗМ										384,09
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,215					70,18
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,18		0,09	37,32	1,52	56,73		5,11
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,18		0,09			304,13		27,37
		91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объемом загрузочной емкости 400 л		маш.-ч	4,37		2,185	95,25	1,34	127,64		278,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,25		0,125	477,92	1,25	597,40		74,68
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,25		0,125			342,46		42,81
		91.21.22-421 Термосы 100 л		маш.-ч	1,5		0,75	26,26	1,29	33,88		25,41
		4 М										9 318,73
		01.1.02-10-1022 Хризотил (асбест хризотилловый), группа БК, марки БК-45, БК-30, БК-20, БК-5		т	0,008		0,004	21 588,35	0,99	21 372,47		85,49
		01.2.01.02-0052 Битум нефтяной строительный БН-70/30		т	0,019		0,0095			39 035,71		313,84
		01.2.01.02-0054 Битум нефтяной строительный БН-90/10		т	0,157		0,0785	22 965,21	1,43	32 840,25		2 577,96
		01.3.01.01-0010 Бензин-растворитель		кг	57		28,5	160,27	1,19	190,72		5 435,52
		01.7.07.13-0001 Маша андеизовая кислотополная, марка А		т	0,125		0,0625	10 415,31	1,36	14 164,82		885,30
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,5		0,25	56,11	1,47	82,48		20,62
		Итого прямые затраты										14 492,91
		ФОТ										4 790,09
		Пр/812-011.0-1, НР Пoles		%	112		0,9	100,8				4 828,41
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011.0, СП Poles		%	65		0,85	55,25				2 646,52
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								43 936,68		21 967,84
		Итого по акту:										21 967,84
		Всего прямые затраты (стандартно)										116 405,26
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										25 031,59
		Эксплуатация машин										24 151,96
		Оплата труда машинистов (ОТм)										14 528,73
		Материалы										52 693,02
		Строительные работы										166 630,60
		в том числе:										
		Оплата труда										24 795,69
		эксплуатация машин и механизмов										24 127,36
		оплата труда машинистов (ОТм)										14 520,71
		материалы										52 212,73
		накладные расходы										34 297,54
		сметная прибыль										16 676,37
		Монтажные работы										1 109,32
		в том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда									236,70
			эксплуатация машин и механизмов									24,60
			оплата труда машинистов (ОТМ)									8,02
			материалы									480,29
			накладные расходы									236,41
			сметная прибыль									124,30
			Всего									167 739,92
			Всего ФОТ (справочно)									39 560,32
			Всего накладные расходы (справочно)									34 533,95
			Всего сметная прибыль (справочно)									16 800,67
			Производство работ в зимнее время 2,86%									4 797,36
			Перевозка 2,5%									4 193,50
			Всего									176 730,70
			(МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2									14 149,30
			ВСЕГО по акту									190 880,00
			Справочно									
			затраты труда рабочих				78,1917					
			затраты труда машинистов				40,29323					

Сдал Индивидуальный предприниматель

Мусалымов Р.К.


Мусалымов Р.К.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял Глава сельского поселения Зилаирский сельсовет

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Юнусбаев И.Д.

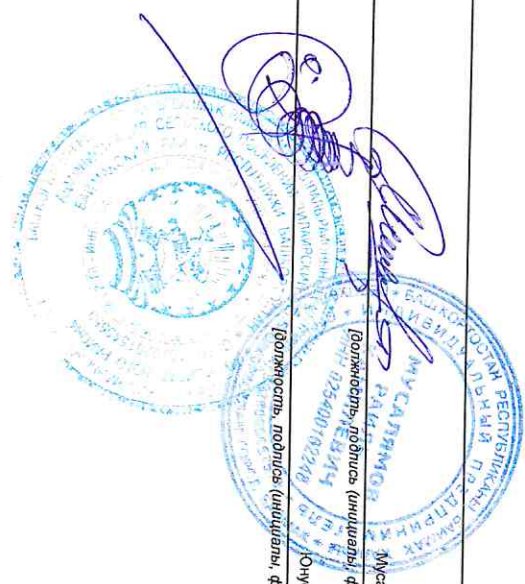

Инвестор:
Заказчик: Администрация СП Зилаирский сельсовет
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Мусалямов Р.К.
Объект: водоснабжение модульного здания СУБ в с. Ургазы МР
Баймакский район

Код	0322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Договор	номер 20
	дата 10.03.2025
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	18.03.2025

Отчетный период	
с	по
10.03.2025	18.03.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				190 880,00
Итого					190 880,00
Сумма НДС					без НДС
Всего с учетом НДС					190 880,00

Заказчик: Администрация СП Зилаирский сельсовет

Юнусбаев И.Я.

Подрядчик Индивидуальный предприниматель

Мусалямов Р.К.

